FIXPUNKT

Wochenbericht KW 47

Baugrube Kirchstraße 12

Erstellt von
Muster Tiefbau GmbH

Baustelle
Baugrube Kirchstraße 12

Stand
18.11.2026, 11:32 UTC

Bezugssystem
ETRS89/UTM32 (EPSG:25832), DHHN2016

Ist aus
Aushub fertig

Aufnahmen	Aushub bisher	Soll/Ist in Toleranz	Zwangspunkte ok
3	800,1 m³	62,5 %	1 / 1

Aushub je Befliegung (gegen das Urgelände)

Befliegung	Datum	Abtrag	Auftrag	Netto
Zwischenstand	10.11.2026	400,0 m³	0,0 m³	–400,0 m³
Aushub fertig	17.11.2026	800,1 m³	0,0 m³	–800,1 m³

Massenziele

Bereich	Material	Art	Soll	Erledigt	Anteil	Offen
Grube	Boden Klasse 4	Abtrag	1.000 m³	800 m³	80 %	200 m³

Je Material: Boden Klasse 4 800 m³ von 1.000 m³.

Letzter Soll/Ist-Vergleich

62,5 % der Fläche innerhalb ± 5,0 cm (berechnet am 18.11.2026).

Zwangspunkte


Zwangspunkt	Lage	Soll	Ist	Ist – Soll	Status
Kanal Bestand	E 512.032,00 · N 5.403.020,00	300,30 m	300,32 m	+2,0 cm	eingehalten

Ist: Gelände der letzten Aufnahme an der Stelle. Eingehalten bis ± 3,0 cm.

Notizen

Notiz	Lage	Text
Bodenprobe BP 2	E 512.015,00 · N 5.403.034,00	Labor, Ergebnis Z0

Fotos

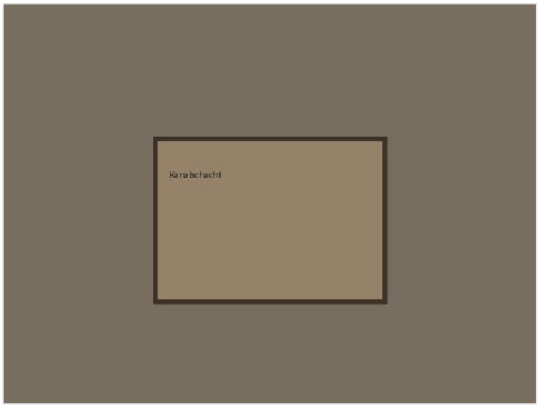

Schacht

17.11.2026, 09:30 UTC
E 512.025,00 · N 5.403.015,00
Blickrichtung 135° (SO)
