FIXPUNKT

Dokumentation

Zwangspunkte, Leitungen, Notizen und Fotos

Baustelle
Baugrube Kirchstraße 12

Stand
18.11.2026, 11:33 UTC

Bezugssystem
ETRS89/UTM32 (EPSG:25832), DHHN2016

Ist aus
Aushub fertig

Zwangspunkte eingehalten	Notizen	Fotos
1 / 1	1	1

Zwangspunkte

Zwangspunkt	Lage	Soll	Ist	Ist – Soll	Status
Kanal Bestand	E 512.032,00 · N 5.403.020,00	300,30 m	300,32 m	+2,0 cm	eingehalten

Ist: Gelände der letzten Aufnahme an der Stelle. Eingehalten bis ± 3,0 cm.


Leitungen

Leitung	Anfang	Länge	Punkte	Notiz
Kanal DN 300	E 512.032,00 · N 5.403.002,00	36,00 m	3	Steinzeug, Bestand

Notizen

Notiz	Lage	Text
Bodenprobe BP 2	E 512.015,00 · N 5.403.034,00	Labor, Ergebnis Z0

Fotos

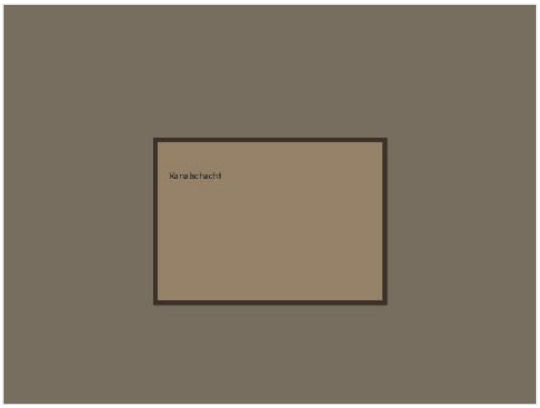

Schacht

17.11.2026, 09:30 UTC
E 512.025,00 · N 5.403.015,00
Blickrichtung 135° (SO)
